



Dotación para unidad de cuidado intensivo de 10 camas en la ese Hospital Universitario de la Samaritana sede Bogotá (4 piso)

Avance % de la ejecución de actividades del proyecto

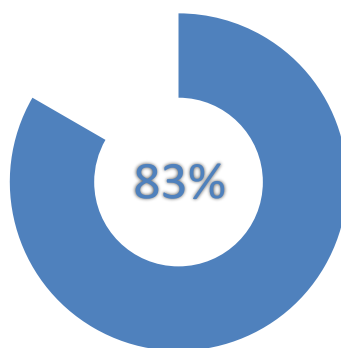



Avance % de la ejecución presupuestal del proyecto



Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

	2019	2020		2021				
Trimestre de cumplimiento	4	2	4	1	2	3	4	
Metodologia General Ajustada								✓
Viabilidad del proyecto								✓
Etapa Contractual								✓
Ejecucion de obra								!

 Fase no ejecutada
 Fase en ejecucion
 Fase terminada

Observaciones de la ejecucion

Proyecto radicado	ultima radicacion 11/11/2019
viabilidad tecnica	emitida 30/12/2019

Se Adquirieron los siguientes equipos

- ASPIRADOR DE SECRECIONES
- MONITOR CON TRAZADO ELECTROCARDIOGRÁFICO
- MONITOR DE TRANSPORTE
- CENTRAL DE MONITOREO
- MONITOR (CENTRAL DE MONITOREO)
- REGULADORES DE VACIO
- DESFIBRILADOR CON MARCAPASO
- VENTILADOR MECANICO
- VENTILADOR DE TRANSPORTE
